

Evidenční číslo: 16/255-1

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily - 2. etapa“

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábt. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01
IČO: 00006599
DIČ: CZ00006599
zastoupená: Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-hospodářského,
dle vnitřního předpisu Úřadu vlády České republiky
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, Odbor technicko-hospodářský

(dále jen „objednatel“)

a

HES stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník, PSČ 140 00
IČO: 28143213
DIČ: CZ28143213
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka oddíl C, vložka 239567
zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., účet č.: 204633379/0600
Oberbank a.s., účet č.: 2051108504/8040
kontaktní osoba: Ivan Šimák, tel. 606 680 178

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 ve spojení s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily - 2. etapa“, ev. č. 16/255-0, kterou uzavřely dne 20.12.2016 (dále jen „smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce uvedené v příloze č. 3 tohoto dodatku s názvem „Úprava plochy před budovou správce - objekt SO 16 (Kalkulace ceny)“ (1. změna projektové dokumentace); a to vše za podmínek stanovených smlouvou a tímto dodatkem a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. II odst. 2 tohoto dodatku za podmínek stanovených smlouvou. Tento dodatek je uzavírán na základě skutečností uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku.
2. V průběhu provádění stavebních prací dle smlouvy na části objektu (specifikovaném v čl. IV smlouvy), a to SO 16 Betonový pochozí chodník plus betonová plocha (dále jen „SO 16“) byla zjištěna nevhodnost a nedostatečnost řešení stanoveného v projektové dokumentaci spočívající v rekonstrukci SO 16 s odváděním dešťových vod do přilehlých travnatých ploch přelivem přes obruby chodníku.

3. Z důvodu zlepšení kvality a vzhledu, užitných kvalit SO 16 a funkčního zlepšení odvádění dešťových vod je nutné
- nahradit plastové kryty šachet drenážního systému litinovými poklopy,
 - vsadit rohožku před vstup do budovy správce a
 - provést odvodnění rohožky.

Podrobný popis zjištěných skutečností je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „Rekonstrukce chodníků v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, Úprava plochy před správní budovou - objekt SO 16“, zpracované Ing. arch. Martinem Krausem (dále jen „projektant“) dne 20.05.2017, a v příloze č. 2 tohoto dodatku obsahující mail projektanta ze dne 21.05.2017 s názvem „Benešova vila - úprava SO 16“ podepsaný projektantem.

4. Provedení stavebních prací uvedených v příloze č. 3 tohoto dodatku je nezbytné pro řádné dokončení části díla - SO 16 dle smlouvy a pro zlepšení kvality a vzhledu SO 16 a funkčního zlepšení odvádění dešťových vod.

Čl. II

Cena

1. Cena stavebních prací dle přílohy č. 3 tohoto dodatku činí 11.598 Kč bez DPH, tj. 14.033,58 Kč včetně DPH a je zároveň uvedena včetně položkového členění v příloze č. 3 tohoto dodatku.
2. **Celková cena díla dle přílohy č. 1 smlouvy Kalkulace ceny po provedení změn tímto dodatkem se mění z částky 1.413.709,72 bez DPH, tj. 1.710.589 Kč včetně DPH na částku 1.425.307,72 Kč bez DPH, tj. 1.724.622,58 Kč včetně DPH.**

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem objednatele.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku, především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Rekonstrukce chodníků v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, Úprava plochy před správní budovou - objekt SO 16

Příloha č. 2 - Mail projektanta ze dne 21.05.2017 s názvem „Benešova vila - úprava SO 16

Příloha č. 3 - Úprava plochy před budovou správce - objekt SO 16 (Kalkulace ceny).

V Praze dne 14.06.2017

za HES stavební s.r.o.



Michal Jakubec
jednatel

HES
STAVEBNÍ s.r.o.

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník


Tel.: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 7.

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky



Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor technicko - hospodářský
118 01 PRAHA 1, nábf. E. Beneše 4

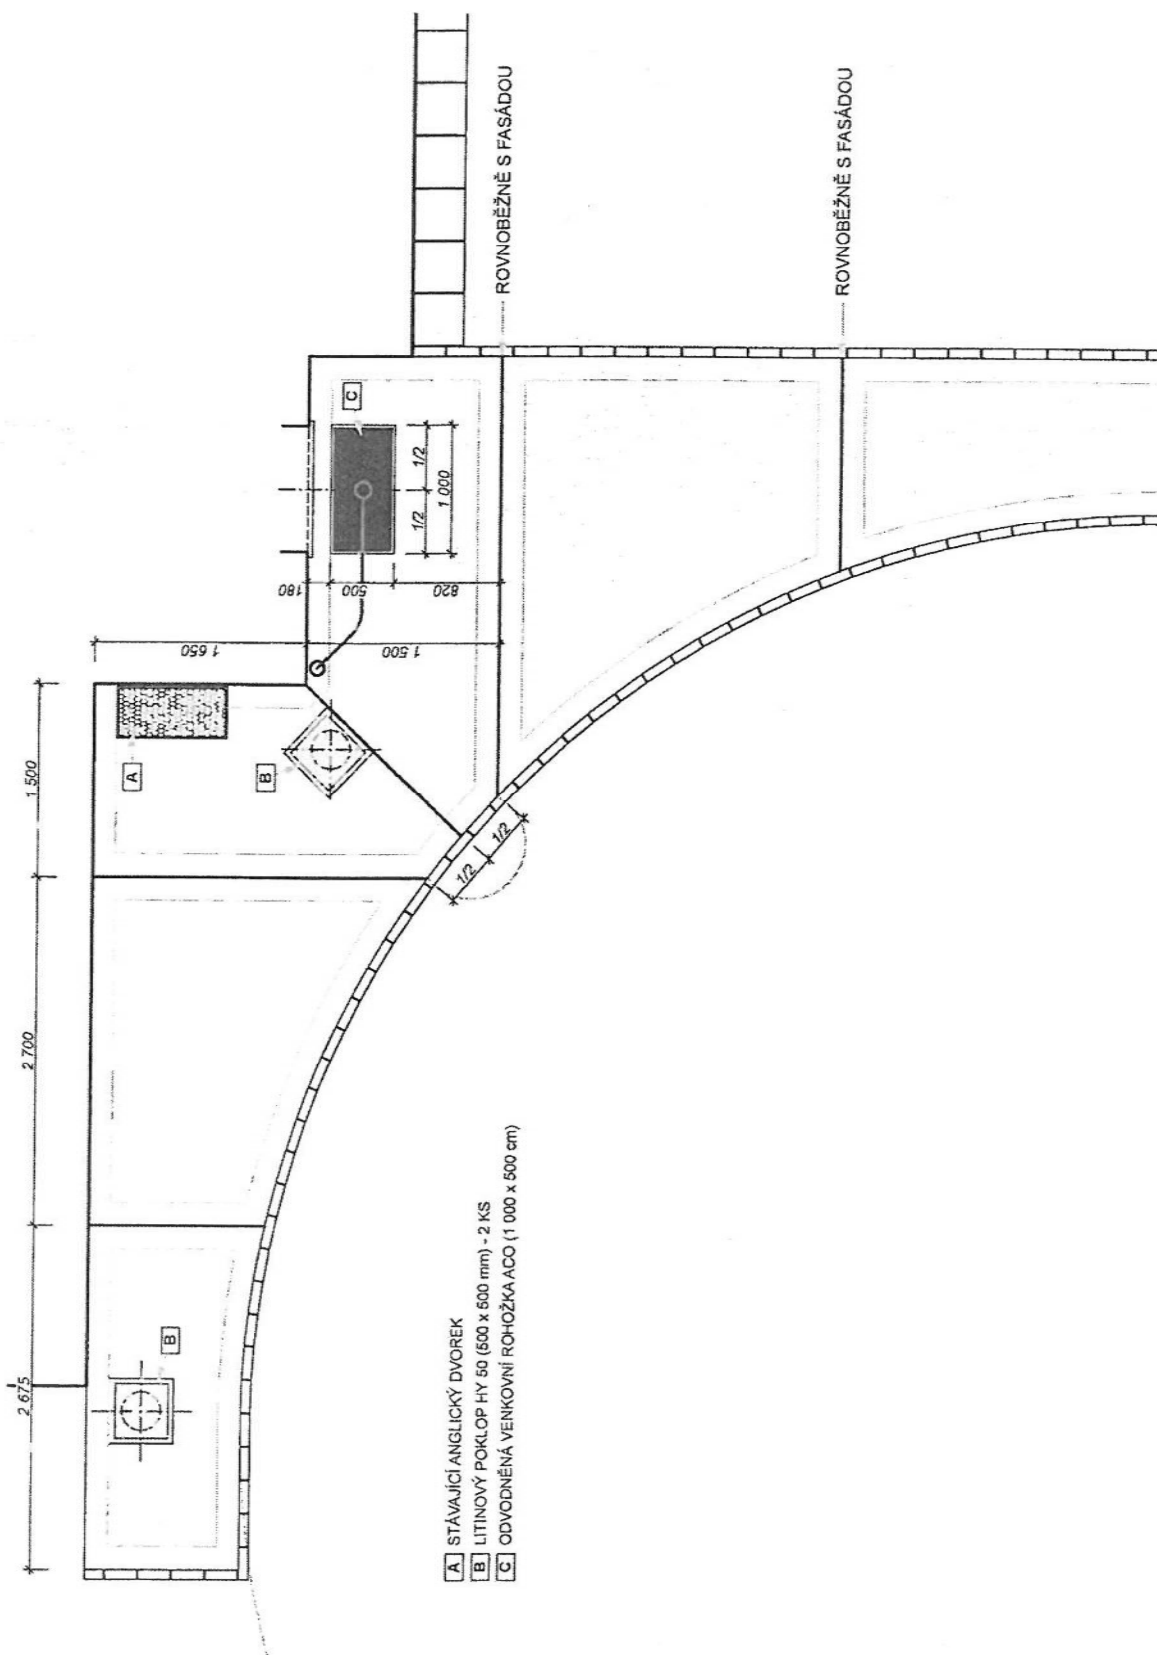

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V AREÁLU BENEŠOVY VILY V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
 ÚPRAVA PLOCHY PŘED SPRÁVNÍ BUDOVOU - OBJEKT SO 16
 DATUM: 20.5.2017
 VYPRACOVAL: ING. ARCH. MARTIN KRAUS



Benešova vila - úprava SO 16

Kraus Martin Komu Igor Michalik, martin.simonovsky

21.05.2017 00:20

Histone.

Tato zpráva byla postoupena.

2 přílohy



PDF

ÚPRAVA SO 16.xls 17-05-20 úprava SO 16.pdf

Dobrý den,

posílám podle dohody návrh na úpravu plochy chodníku před správní budovou - stavební objekt SO 16.

Popis úpravy:

Řešení dané projektem stavby určuje provedení v podobě rekonstrukce plochy ve stávající podobě, tedy s odváděním dešťových vod do přilehlých travnatých ploch přelivem přes obruby chodníku. Navrhovanou úpravou dojde ke zpešení kvality a vzhledu plochy (náhrada plastových krytů šachet drenážního systému litinovými poklopy), užitných kvalit (vsazení rohožky před vstup do budovy) i funkčního zlepšení odvádění dešťových vod (odvodněná rohožka).

Příloha:

- seznam materiálu

- zobrazení úpravy

S pozdravem

Ing. arch. Martin Kraus

[a-detail](mailto:kraus@a-detail)

Kotnovská 165, 390 01 Tábor

+420 608 939 919

kraus@a-detail.cz

ZÁZNAM Z KD. 26.5.2017

DOPORUČUJI REALIZACI
ÚPRAV PODLE PŘÍLOHY

= ÚPRAVA PLOCHY PŘED
SPRÁVNÍ BUDOVOU - OBJ. SO 16
ZE DNE 20.5.17



ÚPRAVA PLOCHY PŘED BUDOVOU SPRÁVCE – OBJEKT SO16

List 1

OZN.	PRVEK	POPIS ÚPRAVY / SPECIFIKACE	PO?ET (KS)	CENA (KS)	CENA DODÁVKA
A	ANGLICKÝ DVOREK – STÁVAJÍCÍ	rám je osazen pod budoucí niveletou chodníku – lem rámu provést pouze z betonu chodníku – sražená hrana cca 8 mm	1	1 500,00	1 500,00
B	LITINOVÝ POKLOP HY 50	plastový poklop šachty drenážního systému snížit a zakrýt litinovým poklopem 500 x 500 mm – nap? Gabex	2	2 035,00	4 070,00
C	VENKOVNÍ ODVODNĚNÁ ROHOŽKA dííl C-1 dííl C-2 dííl C-3 dííl C-4	plní současně funkci odvodnění plochy – odvodnění napojit do dešťového svodu – odtokový otvor DN 100 VARIO VANA Z POLYMERBETONU 1 000 x 500 mm VARIO ÚHELNÍKOVÝ RÁM 1 000 x 500 mm MŘÍŽKOVÝ ROŠT S OKY 30 / 10 mm 1 000 x 500 mm ODPADNÍ POTRUBÍ PVC KG 110 (1,6 bm) – KOMPLET	1 1 1 1 1	2 100,00 1 150,00 2 198,00 580,00	2 100,00 1 150,00 2 198,00 580,00
CELKEM			1	11 598,00	11 598,00

14 033,58 Kč DPH 21%

TDS souhlasí s výše uvedenou kalkulací na úpravu SO16 – úprava plochy před budovou správce. Potvrzuji, že ceny uvedených prací a materiálů jsou v souladu s cenou objemu.

26.5.2017

A. J. SEUTHLAS

List 1

CENA

MONTÁŽ ODKAZ

600,00 <http://www.gabex.cz/Litinove-poklopy-Gabex-trida-B.html>

http://www.aco-self.cz/soubory/soubory/ke_stazeni/katalogy/-%20M17%20%5Bkapitoly%5D/M17_Kap.05_Rohoze.pdf

600,00 katalog ACO, strana 66

350,00 katalog ACO, strana 66

600,00 katalog ACO, strana 67

200,00
